


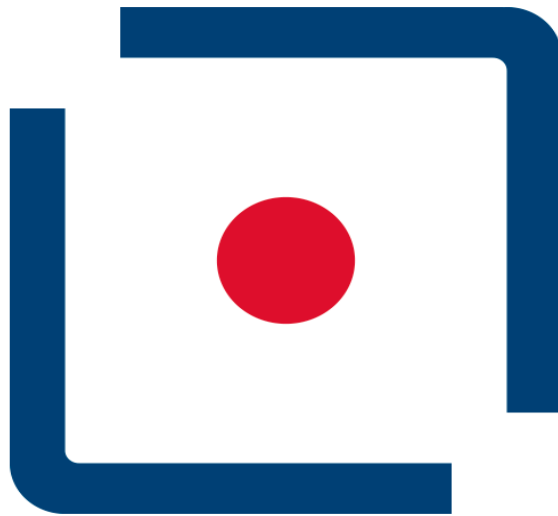

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 2

Desarrollo del primer Sprint

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
 - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
 - EDUARDO CANTERO CUETO
- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ
- **FECHA:** 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INTRODUCCIÓN

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite organizar el desarrollo de un proyecto mediante periodos cortos denominados **Sprints**. Cada Sprint tiene un objetivo definido y un conjunto de actividades seleccionadas del Product Backlog.

La planificación del Sprint permite determinar qué trabajo puede realizarse durante el periodo y cómo será desarrollado. Para ello se establece un objetivo, se seleccionan las actividades y se considera el esfuerzo y la capacidad disponible del equipo.

En el proyecto “**Plataforma web centralizada para la gestión y validación básica de planes de vuelo**”, se establecieron seis *Sprints* de aproximadamente *dos semanas*. Esta organización permitirá desarrollar gradualmente un Producto Mínimo Viable (MVP).

El presente documento describe las actividades correspondientes al **Sprint 1**, así como los resultados obtenidos y las conclusiones de la reunión retrospectiva.

OBJETIVO SPRINT 1

El objetivo del primer Sprint fue establecer las bases necesarias para iniciar el desarrollo de la plataforma.

De acuerdo con la planificación realizada previamente, el Sprint 1 comprende el periodo del **24 de agosto al 6 de septiembre de 2026**, con una estimación inicial de **13 Story Points**, destinados principalmente al análisis de requerimientos y a la preparación y aprendizaje tecnológico.

Las actividades principales fueron:

Actividad	SP	Resultado esperado
Análisis de requerimientos	5	Definir las necesidades y alcance inicial del prototipo
Preparación y aprendizaje tecnológico	8	Preparar las tecnologías necesarias y realizar pruebas iniciales
Total	13 SP	Base técnica para continuar el desarrollo

REPOSITORIO GITHUB

Para llevar un control del código fuente y de los archivos desarrollados durante el proyecto se utiliza GitHub.

El repositorio correspondiente al proyecto es:

- URL: https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git

El repositorio permitirá mantener organizado el desarrollo del prototipo y registrar los cambios que se realicen durante los siguientes Sprints.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Para desarrollar el proyecto se distribuyeron las responsabilidades entre los integrantes. Daniel participa de manera transversal en las diferentes áreas, mientras que Eduardo colabora principalmente en las actividades de análisis, desarrollo, integración y pruebas.

Área / Rol	Daniel	Eduardo
Product Owner	✓	
Scrum Master	✓	
Análisis de requerimientos	✓	✓
Desarrollo frontend – Vue.js	✓	✓
Desarrollo backend – PHP	✓	✓
Base de datos – MongoDB	✓	
Integración frontend/backend/BD	✓	✓
Pruebas	✓	✓
Documentación	✓	✓
Administración de GitHub	✓	

Esta distribución permitirá compartir las actividades de desarrollo manteniendo una coordinación general del proyecto.

INFORMACIÓN DE LO REALIZADO

Durante el Sprint 1 se trabajó principalmente en la definición del proyecto y en la preparación de las tecnologías necesarias para comenzar su construcción.

Primero se analizaron los requerimientos del prototipo y se delimitó su alcance. Se determinó que el MVP deberá contar con una base de datos centralizada, una interfaz web, consultas de información y validaciones básicas de los datos relacionados con los planes de vuelo. Estas características ya habían sido establecidas como parte del alcance del proyecto.

También se definió la arquitectura tecnológica inicial:

- **Usuario → Vue.js → HTTP/JSON → PHP → MongoDB**

Para el frontend se utilizará **Vue.js**, mientras que PHP realizará las funciones correspondientes al backend. MongoDB será utilizado para almacenar de manera centralizada la información y mongosh permitirá administrar y realizar pruebas sobre la base de datos.

Durante este Sprint también se realizaron actividades de preparación y aprendizaje tecnológico necesarias para continuar con el desarrollo. Esto permitió familiarizarse con la creación y consulta de colecciones en MongoDB y con la estructura que posteriormente utilizará la aplicación web.

Finalmente, se estableció el repositorio de GitHub **ATC_FPL**, que será utilizado para mantener el código y los avances realizados durante el desarrollo.

RESULTADOS SPRINT 1

Al finalizar el Sprint 1 se obtuvieron las bases necesarias para continuar con la construcción del prototipo.

Los principales resultados fueron la definición de los requerimientos iniciales, delimitación del MVP, selección de las tecnologías, preparación del entorno de desarrollo, realización de pruebas iniciales con la base de datos y establecimiento del repositorio GitHub.

Estos resultados son importantes porque el objetivo del primer Sprint no era desarrollar completamente la aplicación, sino reducir la incertidumbre técnica y preparar los componentes que serán utilizados en los siguientes ciclos.

Esta decisión coincide con los riesgos identificados previamente, donde la **curva de aprendizaje** se consideró de impacto alto y se determinó reservar precisamente el Sprint 1 para aprendizaje y pruebas pequeñas.

REUNIÓN RETROSPECTIVA

Al finalizar el Sprint se realizó una retrospectiva para analizar el trabajo efectuado, identificar los aspectos positivos y determinar oportunidades de mejora.

La retrospectiva es una parte importante del ciclo de Scrum porque permite identificar mejoras que pueden aplicarse en el siguiente Sprint.

Pregunta	Resultado
¿Qué salió bien?	Se definió claramente el alcance inicial del proyecto y las tecnologías necesarias para desarrollar el prototipo.
¿Qué dificultades encontramos?	La principal dificultad fue la curva de aprendizaje relacionada con la integración de las diferentes tecnologías.
¿Qué aprendimos?	Se adquirió mayor conocimiento sobre Vue.js, PHP, MongoDB, JSON y la organización del desarrollo mediante Scrum.
¿Qué podemos mejorar?	Dividir las actividades técnicas en tareas más pequeñas y realizar pruebas de integración desde etapas tempranas.
¿Qué haremos en el siguiente Sprint?	Continuar con el diseño e implementación inicial de la base de datos y comenzar el diseño de la interfaz.

La última acción mantiene continuidad con la planeación original, ya que el **Sprint 2, del 7 al 20 de septiembre**, está destinado al diseño e implementación inicial de la base de datos y al diseño de la interfaz.

EVIDENCIA DEL REGISTRO EN GESTOR DE PROYECTOS

Como parte de la actividad, se realizó el registro del proyecto en la plataforma Gestor de Proyectos de UDGVirtual.

En la pestaña **REGISTRA** se integraron los datos correspondientes al proyecto “Plataforma web centralizada para la gestión y validación básica de planes de vuelo”.

A continuación, se presenta la captura de pantalla como evidencia del registro realizado:



La captura permite comprobar que la información del proyecto fue registrada en la plataforma solicitada como parte de la actividad.

CONCLUSIÓN

El Sprint 1 permitió establecer las bases necesarias para comenzar el desarrollo de la plataforma web centralizada para la gestión y validación básica de planes de vuelo.

Durante este periodo se trabajó principalmente en los requerimientos, definición del alcance, selección tecnológica, preparación del entorno y pruebas iniciales. Estas actividades permitieron reducir parte de la incertidumbre técnica existente antes de comenzar con funciones más complejas.

La aplicación de Scrum permitió organizar estas actividades dentro de un periodo definido y establecer objetivos concretos. A partir de los resultados y de la retrospectiva realizada, el siguiente Sprint podrá enfocarse en comenzar la construcción de la base de datos y de la interfaz del prototipo.

BIBLIOGRAFÍA

- García, M. (2020, 12 de julio). *¿Qué es un SPRINT en Scrum?* IT-tude. IT-tude — [¿Qué es un SPRINT en Scrum?](#)
- West, D. (2022). *Planificación de sprints*. Atlassian. Atlassian — [Planificación de sprints](#)
