


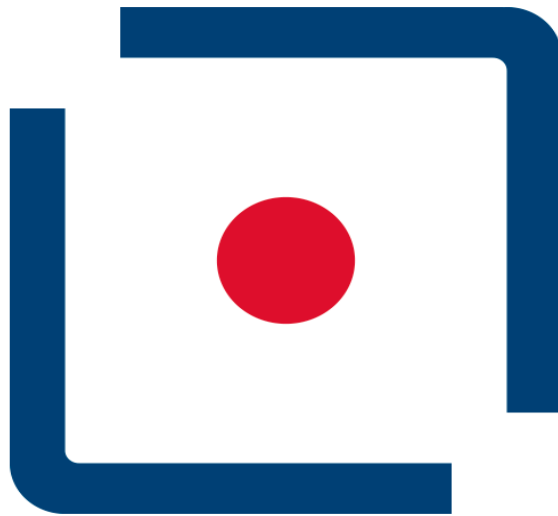

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 2

DESARROLLO DEL SEGUNDO SPRINT

“RETROSPECTIVA”

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
 - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
 - EDUARDO CANTERO CUETO
- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ
- **FECHA:** 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

OBJETIVO DE LA RETROSPECTIVA

Al finalizar el segundo sprint realizamos una revisión del trabajo para identificar qué salió bien, qué dificultades tuvimos y qué podemos cambiar para trabajar de una manera más ordenada en el siguiente sprint. Esta retrospectiva no se enfoca solamente en las funciones terminadas, sino también en la forma en que nos organizamos como equipo y en lo que aprendimos durante el desarrollo.

ENLACE DEL DESARROLLO

El código fuente y los avances del proyecto, así como la documentación correspondiente al **Sprint 2 y los resultados de la retrospectiva**, se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto: [ATC_FPL – GitHub](https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL). La información se encuentra organizada en diferentes ramas para facilitar la consulta del desarrollo y de la documentación correspondiente a cada etapa.

⇒ https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git

GitHub me ha servido para mantener organizado el proyecto y conservar los cambios que voy realizando. Para los siguientes sprints considero conveniente comenzar a utilizar etiquetas o releases para identificar con mayor claridad qué versión corresponde a cada entrega.

RESULTADO GENERAL DEL SPRINT 2

Consideramos que el resultado del Sprint 2 fue positivo. Durante esta etapa logramos avanzar en dos partes fundamentales de ATCFPL: la base de datos centralizada y la estructura inicial de la interfaz web. En MongoDB comenzamos a organizar la información aeronáutica y realizamos pruebas de consulta; al mismo tiempo, con Vue.js y Vite construimos las primeras vistas y componentes de la aplicación.

También comenzamos a trabajar en la integración con el backend. Aunque originalmente habíamos considerado PHP, durante las pruebas decidimos continuar con Node.js y Express, ya que nos resultó más práctico mantener JavaScript tanto en el frontend como en el servidor. Esta decisión no cambia el objetivo del proyecto, pero sí modifica la tecnología que utilizaremos para continuar el desarrollo.

¿QUÉ FUNCIONÓ BIEN?

- Pudimos cargar y consultar información aeronáutica en MongoDB, lo que confirmó que la base de datos puede utilizarse como punto central para la información del prototipo.
- La interfaz en Vue.js comenzó a tomar una estructura más clara mediante componentes como el Sidebar, encabezado, reloj UTC, pie de página y las primeras vistas.
- Realizar pruebas de integración desde etapas tempranas nos ayudó a comprobar que frontend, backend y base de datos pueden trabajar en conjunto.

- La comunicación entre los dos integrantes permitió revisar avances y apoyarnos cuando alguna parte de la integración presentó dificultades.
- Algunas consultas de rutas se adelantaron respecto a la planeación, lo cual nos permitió comprobar anticipadamente parte de la arquitectura.

¿QUÉ DEBEMOS MEJORAR?

Durante el sprint también aparecieron varios problemas. Algunos estuvieron relacionados con la curva de aprendizaje de Vue.js, Vite, Node.js y MongoDB. Tuvimos errores en componentes, etiquetas del template, ejecución de comandos desde carpetas incorrectas y modificaciones del servidor. Estos problemas hicieron que algunas tareas requirieran más tiempo del esperado.

También observamos que cuando realizábamos varios cambios al mismo tiempo era más difícil identificar qué modificación había provocado un error. Por esta razón necesitamos trabajar de una forma más incremental, probar cada cambio y mantener mejor documentadas las configuraciones que ya funcionan.

ACUERDOS DE LA RETROSPECTIVA

Situación observada	Aprendizaje	Acción para el siguiente sprint
Algunos datos necesitaron revisión antes de poder utilizarlos correctamente.	No debemos asumir que todos los archivos tienen una estructura lista para importar.	Revisar y validar los datos antes de incorporarlos a nuevas colecciones.
Varios cambios simultáneos dificultaron localizar algunos errores.	Los cambios pequeños son más fáciles de probar y corregir.	Realizar una modificación a la vez y comprobar que la aplicación siga funcionando.
Tuvimos problemas por ejecutar comandos desde directorios incorrectos.	La organización del proyecto también forma parte del desarrollo.	Documentar comandos, rutas de ejecución y configuraciones que ya funcionan.
Se adelantaron funciones previstas para otros sprints.	Adelantar trabajo puede ser útil siempre que no se pierda el objetivo del sprint actual.	Separar claramente el trabajo comprometido del trabajo adelantado.
El proyecto es desarrollado por dos integrantes.	La coordinación ayuda a evitar duplicar cambios y facilita la revisión.	Mantener comunicación sobre qué parte está trabajando cada integrante y revisar juntos la integración.

MODIFICACIONES ACORDADAS PARA EL SPRINT 3

Después de la retrospectiva decidimos mantener el objetivo general planteado para el Sprint 3: trabajar en la captura de datos, el acceso básico y las primeras consultas. Sin embargo, realizaremos algunos ajustes en la forma de trabajar y en la tecnología utilizada.

- Continuar el backend con Node.js y Express en lugar de PHP.
- Seguir desarrollando la API REST para comunicar Vue.js con MongoDB.
- Avanzar en el formulario para registrar nuevos planes de vuelo.
- Guardar planes de vuelo de prueba en la base de datos.
- Agregar validaciones iniciales y mensajes de error.

- Realizar cambios pequeños y probarlos antes de integrar nuevas funciones.
- Mantener una mejor coordinación de las actividades entre los dos integrantes.

CONCLUSIÓN DE LA RETROSPECTIVA

Esta retrospectiva nos permitió reconocer que el Sprint 2 no solamente dejó avances técnicos, sino también varios aprendizajes sobre la forma de desarrollar el proyecto. Los errores encontrados nos ayudaron a comprender mejor las herramientas y a identificar una forma de trabajo más ordenada.

Para el siguiente sprint queremos conservar lo que funcionó bien y corregir los puntos que nos hicieron perder tiempo. La intención es continuar avanzando sin apresurar la incorporación de nuevas funciones y mantener una mejor coordinación entre ambos integrantes. Con la base de datos y la interfaz inicial ya desarrolladas, el siguiente paso será enfocarnos en la captura y consulta de planes de vuelo.
